

Kadeversterking Eemskanaal, traject Oostersluis - Jan B. Bronssluis

Stand werkzaamheden

Met de zomervakantie in zicht, beginnen ook de werkzaamheden van Beens Groep aan een einde te komen. Na de afronding van de eerste fase, bevinden zich ook de tweede en derde fase in de afronding. Zoals u wellicht al gezien heeft, zijn vrijwel alle betonplaten in fase twee geplaatst. Na het plaatsen van de laatste betonplaten zullen de afrondende werkzaamheden starten, waarna fase twee weer opengesteld wordt voor fietsers en voetgangers.

Fase drie begint tevens op een einde te lopen. Nabij de Borgbrug liggen een aantal kabels en leidingen in de ondergrond. De werkzaamheden rondom deze voorzieningen hebben helaas wat vertraging opgelopen. Hierom zullen deze werkzaamheden na de zomervakantie worden afgerond. Dit betekent dat u tot na de zomervakantie nog hinder zult ondervinden van werkzaamheden. Deze hinder bestaat voornamelijk uit een langere afsluiting van het Roeierspad en beperkte geluidshinder. Vanaf de bouwvak (week 32, 33 en 34) zal het Roeierspad afgesloten zijn vanaf de Rollen tot aan het looppad richting de Roggeplein (vak paars).


De werkzaamheden in fase vier zijn reeds ook in volle gang. Alle bewoners zijn geïnformeerd betreffende de planning, een bewonersbijeenkomst is gehouden en alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Zo ligt er voor de bewoners een tijdelijke parkeervoorziening nabij de Allesco Esso Center en zijn alle brievenbussen verplaatst. Ook is er een tijdelijke 'nood' weg aangelegd in het geval zich een calamiteit voordoet waarvoor hulpdiensten (brandweer, ambulance ed) nodig zijn.

Planning

In fase twee zijn de werkzaamheden in de afrondende fase. Het fietspad nabij de Driebondsbrug wordt aangelegd en verderop bij het Roeierspad dient er nog een kleine sanering te worden uitgevoerd. Daarnaast worden binnenkort de loopbruggen weer aangesloten op het dijklichaam.

Zoals aangegeven wordt een deel van de werkzaamheden van fase drie opgeschoven tot na de zomervakantie. Dit betekent niet dat er geen verdere werkzaamheden plaatsvinden in fase drie: de betonplaten worden nog neergelegd, de geplaatste ankers worden nog afgespannen (op sterkte brengen) en afrondende montagewerkzaamheden vinden plaats aan de damwandconstructie.

Nu de werkzaamheden in fase vier zijn gestart, wordt in deze fase begonnen met het zetten van de damwandconstructie, de verankering wordt geplaatst en wordt er gestart met het montagewerk. Het bijzondere in deze fase is de bereikbaarheid van de aanwonenden. Waar in de voorgaande fases het wegvak werd afgesloten voor onbevoegden, moet de Rollen na werktijd weer open zijn voor omwonenden. Hiertoe zijn er afspraken gemaakt tussen de bewoners en alle uitvoerende partijen.

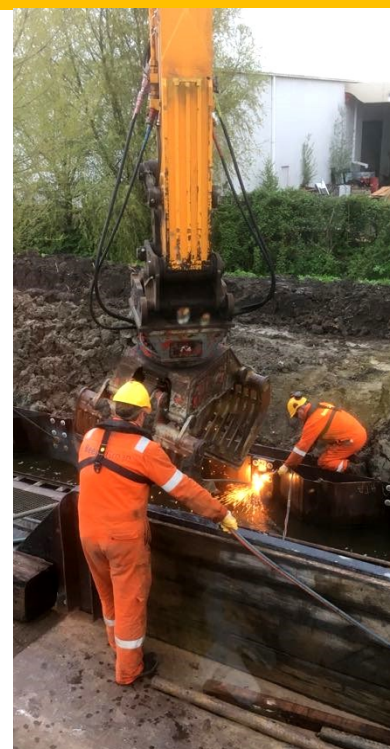

IN DIT NUMMER

Stand Werkzaamheden	1
Planning	1
Na de bouwvak:	1
Traject Garmerwolde	2
Omgevingscoördinator	2

Na de bouwvak:

Na de bouwvak zal Beens Groep nog een aantal werkzaamheden uitvoeren. Deze beslaan:

- Werkzaamheden kabels en leidingen rondom Borgbrug (paars);
- Monteren drenkelingtrappen;
- Plaatsen steenbestorting;
- Zetten damwand Driewegsluis;
- Landhoofden Borgbrug;

Van deze werkzaamheden zult u minimale hinder ondervinden.

Omgevingscoördinator: ook voor u!

Voor alle belanghebbenden bij het project 'Kadeversterking Eemskanaal noordzijde, traject Oostersluis - Bronssluis' staat er een omgevingscoördinator van de opdrachtnemer klaar. Hij is het eerste aanspreekpunt voor u al uw vragen en opmerkingen.

Jaap van Dijk, omgevingscoördinator Beens Groep, kunt u via verschillende manieren bereiken:

- Telefonisch via 06 11 17 81 56
- E-mail via eemskanaal@beensgroep.nl
- via www.verbeterdebouw.nl
- Persoonlijk via het wekelijkse inloopspreekuur: woensdags van 16:30 uur tot 17:30 uur in Buurt- en speeltuinvereniging Ruischerbrug.

Traject Garmerwolde

Tijdens de werkzaamheden aan het Eemskanaal is Beens Groep niet alleen bezig met werkzaamheden tussen de Oostersluis en de Jan B. Bronssluis, maar ook op het traject tussen de Jan B. Bronssluis en Woltersum gaat Beens Groep aan het werk. Het zogenoemde traject 'Garmerwolde'.

Op dit traject dient Beens Groep op een achttal locaties overkluizingen te maken. Deze constructies, ook wel coupures genoemd, zorgen voor een stevige en waterdichte kadeconstructie op locaties waar kabels en/of leidingen de damwandlijn kruisen. Op deze plekken kunnen geen volledige damwandplanken de grond in worden geplaatst, waardoor een alternatieve oplossing gevonden moet worden.



Eén van de oplossingen wordt geplaatst: een verkort schot

Vaart u binnenkort over het water en ziet u verderop schepen van Beens Groep liggen? Hopelijk herinnert u zich dan dit bovenstaande bericht.

Nylonstraat 16
8281 JX Genemuiden

Postbus 6
8280 AA Genemuiden

Tel. 038 - 385 55 85
info@beensgroep.nl
www.beensgroep.nl

